

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části
U S N E S E N Í

č. 378

ze dne 20.03.2018

Vyhodnocení plnění Akčního plánu na rok 2017 - závěrečná zpráva

Zastupitelstvo městské části

I. bere na vědomí

1. Závěrečnou zprávu o vyhodnocení Akčního plánu na rok 2017, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

II. schvaluje

1. Závěrečnou zprávu o vyhodnocení Akčního plánu na rok 2017, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části

Vyhodnocení plnění Akčního plánu na rok 2017

Závěrečná zpráva ke dni 31. 12. 2017

Obsah:

1	Úvod	3
2	Proces vyhodnocení plnění Akčního plánu na rok 2017	3
3	Přehled plnění aktivit - Akční plán na rok 2017 - hodnocení k 31.12. 2017.....	4
4	Opakující se akce Akčního plánu na rok 2017	17
5	Shrnutí.....	20

1 Úvod

Akční plán na rok 2017 naplňující Strategický plán rozvoje MČ Praha 3 schválilo zastupitelstvo MČ Praha 3 při svém zasedání dne 20. 12. 2016 usnesením č. 249.

Akční plán vychází ze Strategického plánu rozvoje městské části Praha 3, který představuje základní orientaci rozvoje MČ v období 2014 – 2020. Akční plán obsahuje přehled akcí – projektových záměrů, které chce MČ Praha 3 v průběhu roku 2017 realizovat a které jsou navázány na rozvojové aktivity Strategického plánu rozvoje. Jejich prostřednictvím chce MČ Praha 3 naplňovat svou vizi rozvoje, strategické cíle a programové úkoly.

Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje průběžné vyhodnocování plnění. Tedy porovnání skutečného stavu s plánem, čeho mělo být dosaženo. Je tak možné včas zaznamenat případné problémy a přijmout potřebná opatření. Proto by takové hodnocení mělo probíhat nejméně jednou za půl roku. Při jednoletých akčních plánech se pro půlroční interval hodnocení rozhodla i MČ Praha 3. Proto ke konci června 2017 proběhlo průběžné posouzení plnění Akčního plánu 2017 a ke dni 31. 12. 2017 bylo provedeno vyhodnocení akčního plánu po dokončeném roce.

2 Proces vyhodnocení plnění Akčního plánu na rok 2017

Akční plán na rok 2017 obsahoval 55 projektových záměrů. V průběhu ledna a února 2018 byly zrevidovány všechny projektové záměry ve spolupráci s vedoucími jednotlivých odborů. Ke každému projektovému záměru byl uveden komentář o aktuálním stavu.

Jednotlivé projektové záměry byly zařazeny do kategorií dle jejich stavu plnění.

míra plnění	popis
splněno	Přiřazeno akcím, které měly charakter jednorázového plnění a byly v době hodnocení dokončeny (splněny) .
plněno pravidelně	Toto hodnocení bylo přiřazeno akcím, jež nemají jednorázový charakter, ale jejichž realizace probíhá opakovaně (každoročně) .
plněno průběžně	Stejně jako v předchozím případě bylo toto hodnocení přiřazeno akcím, jež nemají jednorázový charakter . Průběžné plnění značí postupné naplňování cíle opatření s ohledem na rozsah akce (rekonstrukce různých objektů, výstavba apod.) nebo vnější okolnosti (např. finanční náročnost).
plněno	Hodnocení přiřazeno akcím, jejichž realizace byla započata, ale nebyla v rámci sledovaného období dokončena .
splněno částečně	Toto označení mají akce, jejichž cíl byl splněn pouze v omezené míře .
neplněno	Hodnocení akcí, jejichž cíl nebyl naplněn.

3 Přehled plnění aktivit - Akční plán na rok 2017 - hodnocení k 31. 12. 2017.

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Stav plnění	Komentář k plnění v roce 2017	Důvod zpoždění (v případě opoždění)
OBNP	30	Gregor (hospodaření s byty)	Obecní bytový fond	plněno průběžně	Obecní bytový fond je doplňován dalšími byty, které si městská část hodlá ponechat.	
OBNP	31	Vítkovská (hospodaření s nebyty)	Program rozvoje fondu nebytových prostor	plněno průběžně	Portfolio nebytových prostorů je zachováno, pasportizace nebytových prostor probíhá současně s revizí nájemních smluv.	
OD	33	Vítkovská (doprava)	Analýza dopravně bezpečnostního stavu před vybranými ZŠ a MŠ	plněno průběžně	Na základě analýzy vyhotovena studie k další problematické lokalitě na Praze (Jeseniova - Ambrožova). Řešení dalších problematických míst ve spolupráci s RFD MHMP (BESIP).	
OD	34	Vítkovská (doprava)	Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Jeseniova x Tovačovského a Jeseniova x Koldínova	plněno	Bylo vydáno stavební povolení na obě akce. Realizace bude provedena prostřednictvím TSK hl.m. Prahy. Tato realizace je odvislá od akce PVS výměna vodovodního řadu v lokalitě.	Koordinace s akcí PVS - realizace možná až po výměně vodovodního řadu v lokalitě.
OD	35	Vítkovská (doprava)	Zavedení autobusové dopravy mezi dolním Žizkovem a Jiřího z Poděbrad	plněno	Na základě jednání s ROPID byl zvolen jiný model zřízení autobusové linky a to prodloužení jedné ze stávajících linek MHD (připravuje ROPID). Zavedení linky pouze na území Prahy 3 naráží na nedostatek autobusů a zejména na nedostatek řidičů.	Změna koncepce
OD	71	Vítkovská (doprava)	Úprava přechodů pro chodce v křižovatce Ondříčkova x Blodkova x Laubova	plněno	Bylo požádáno o stavební povolení (vydáno počátkem roku 2018). Realizace bude provedena prostřednictvím TSK hl.m. Prahy. Tato realizace je odvislá od akce PVS výměna vodovodního řadu v lokalitě.	Problémy při získávání stanovisek vlastníků sítí v lokalitě ke stavebnímu povolení.

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Stav plnění	Komentář k plnění v roce 2017	Důvod zpoždění (v případě opoždění)
OD	72	Vítkovská (doprava)	Úprava přechodů pro chodce v okolí ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta	plněno	Nadále probíhá projektová příprava a získávání potřebných stanovisek. Různé návrhy řešení nebyly přijímány zejména ze strany orgánů památkové péče. Akceptovatelné řešení nalezeno až před koncem roku.	Negativní stanoviska orgánů památkové péče k navrhovaným řešením.
OI	60	Papež (informatika)	Portál elektronického úředníka	plněno průběžně	Probíhá příprava zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku.	
OI	61	Papež (informatika)	Mobilní aplikace pro občany	plněno průběžně	V roce 2017 byl komisí pro informatiku a web projednán rozsah funkčnosti aplikace a v závěru roku byla uzavřena smlouva o dílo s dodavatelem. Aplikace je připravena k distribuci, řeší se problematika umístění do aplikačních storů pod účtem.	
OK	37	Bellu (kultura)	Osazování uměleckých děl ve veřejných prostranstvích Prahy 3 (dříve "Osazování kulturních děl ve veřejných prostranstvích Prahy 3" "Osazování výtvarných děl na vrchu Vítkov")	plněno průběžně	Byly zpracovány podmínky soutěže, vybrána porota na konceptuální plastiku na Basilejské náměstí. K samotné realizaci soutěže nedošlo.	Zpoždění zahájení soutěže je prozatím odloženo v souvislosti s vyjasňováním zásahu platného ÚR do stávající podoby náměstí.
OK	38	Bellu (kultura)	Rozšiřování zahraničních vztahů MČ Praha 3 v oblasti kultury (dříve "Spolupráce se zahraničními partnery v oblasti kultury")	plněno průběžně	Byly realizovány společné kulturní projekty s účastí velvyslanectví Asie, Latinské Ameriky, Slovinska a nově Itálie, RMČ schválila záměr navázání partnerství s londýnskou čtvrtí Camden town a byla zahájena komunikace.	

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Stav plnění	Komentář k plnění v roce 2017	Důvod zpoždění (v případě opoždění)
OK	40	Bellu (kultura)	Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - památka UNESCO	neplněno	Záměr podpory nominace kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech nebude realizován z důvodu změny koncepce nominovaných objektů. Plánovaná nadnárodní nominace Slovinsko - česká byla slovinskou stranou v prosinci 2017 oficiálně ukončena.	
OOR	56	Materna (finance)	Participativní rozpočet	splněno	V roce 2017 proběhly všechny plánované aktivity v rámci projektu. Konkrétně to bylo informování a motivace občanů, podávání návrhů projektů občanů, posouzení návrhů občanů odborníky, prezentace návrhů na výstavě, hlasování o projektech navržených občanů a vyhodnocení projektu. Z úspěšných občanských projektů již byly v roce 2017 realizovány například pouliční záhonky, zrekonstruovány prostory před ZŠ Jeseniova, bylo nově rozšířeno hřiště na Parukářce apod.	
OOŽP	2	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Revitalizace Kostnického náměstí	plněno	Byly provedeny přeložky sítí. Stavba bude zahájena na jaře 2018.	Koordinace zadání investičních akcí dle rámcové dohody.
OOŽP	3	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou A25 v ulici Pod Krejčárkem	splněno	Kompletní projektová dokumentace předána na MHMP k realizaci TSK.	

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Stav plnění	Komentář k plnění v roce 2017	Důvod zpoždění (v případě opoždění)
OOŽP	8	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Revitalizace Komenského náměstí	plněno	Stavba zahájena, probíhají zemní práce.	
OOŽP	9	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Obnova náměstí Barikád a umístění dětského hřiště	plněno	Byla zpracována projektová dokumentace a proveden výběr zhotovitele. Stavba bude zahájena v lednu 2018.	
OOŽP	23	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic	neplněno		Vzhledem k počtu zadaných úkolů pro OOŽP a vzhledem k výši schváleného rozpočtu se uvedený projekt nerealizoval. Předpoklad zahájení zhotovení dokumentace je rok 2018.
OOŽP	63	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Posílení potenciálu parku Židovské Pece	plněno	Probíhá zpracování dokumentace pro UR.	Spojení projektu s dotací MHMP smart city.
OOŽP	64	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Park Parukářka	plněno	ZMČ vzalo na vědomí urbanistickou studii.	
OOŽP	65	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Horní parter Žižkova náměstí	plněno	Bylo zadáno vypracování studie, která ukáže další postup.	

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Stav plnění	Komentář k plnění v roce 2017	Důvod zpoždění (v případě opoždění)
OOŽP	66	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Plocha veřejné zeleně U Kněžské louky	plněno	Byla dokončena dokumentace k UR.	
OOŽP	67	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad	neplněno		MHMP neodsouhlasilo dotaci pro realizaci obnovy náměstí Jiřího z Poděbrad. Z tohoto důvodu MČ Praha 3 nepokračovala ve zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.
OOŽP	68	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Cyklostezka pod Vítkovem – umístění herních a fitness prvků	plněno	Na základě žádosti byla přidělena dotace z MHMP Smart city.	Spojení projektu s dotací MHMP smart city. Nevyjasněné majetkové poměry.
OOŽP	69	Materna PhD. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Úprava multifunkčního hřiště Habrová	plněno	Byla zpracována dokumentace pro UR.	Soulad s územním plánem.
OOŽP	70	Materna PhD. (životní prostředí)	Interaktivní informační tabule v parcích	plněno	Byla zpracována projektová dokumentace.	Spojení projektu s dotací MHMP smart city.

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Stav plnění	Komentář k plnění v roce 2017	Důvod zpoždění (v případě opoždění)
OOŽP	77	Materna Ph.D. (životní prostředí) Hujová (územní rozvoj)	Čistá Trojka	plněno pravidelně	Probíhá na základě uzavřené smlouvy.	
OOŽP	78	Hujová (územní rozvoj)	Program Antigraffiti na území MČ Praha 3	plněno pravidelně	V prosinci uzavřena smlouva na základě VŘ.	Vydávání stanovisek OPP MHMP.
OŠ	73	Suková (školství)	Vydání doporučujících kritérií etického kodexu pedagoga školy zřízené MČ Praha 3	splněno	Předáno ředitelům na výjezdní poradě s doporučením projednat s pedagogickými pracovníky.	
OŠ	74	Suková (školství)	Vytvoření metodických center	splněno	V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání byly vytvořeny pracovní skupiny se zaměřením na předškolní a základní vzdělávání.	
OŠ	75	Suková (školství)	Webový portál www.skolypraha3.cz jako podpůrný nástroj MAP a Smart Cities	splněno	Webový portál byl vytvořen a je využíván všemi našimi školami.	
OŠ	76	Suková (školství)	Vydání literárních pracovních listů pro 2. stupeň základních škol Prahy 3	splněno	Pracovní listy na podporu čtenářské gramotnosti Čtení do lavic a laviček byly vytvořeny pracovníky OŠ a rozdány všem žákům 2. stupně našich škol.	
OTSMI	1	Holeček (investice)	Rekonstrukce budovy na malometrážní byty – Bořivojova 27	splněno	Stavba dokončena v objektu je vybudováno 26 bytů. Byty jsou vybaveny sociálním zařízením, v ze dvou nových objektů je zbudována samostatná kotelna, v hlavním pak výtah se šesti stanicemi. Bylo dokončeno v souladu s platnou SoD včetně dodatků.	
OTSMI	4	Vítkovská (doprava)	Chodníkový program – obnova povrchu Chodníků	plněno průběžně	Celá agenda - Chodníkový program byla předána a převedena na Správu zbytkového majetku Praha 3, a.s.	

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Stav plnění	Komentář k plnění v roce 2017	Důvod zpoždění (v případě opoždění)
OTSMI	6	Holeček (investice)	Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Havlíčkovo náměstí 10	plněno	V roce 2017 byla dokončena veškerá projektová dokumentace, získáno stavební povolení, provedena kontrola rozpočtu a stavba je připravena k zahájení výběrového řízení na dodavatele a realizaci. Projektová příprava byla dokončeno v souladu s platnou SoD.	
OTSMI	7	Holeček (investice)	Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu MČ – Lipanská 7	splněno	Stavba je dokončena, byly vybudovány nové kancelářské prostory pro potřeby úřadu MČ. Bylo dokončeno v souladu s platnou SoD včetně dodatků.	
OTSMI	10	Holeček (investice)	Stavební úpravy vnitrobloku Jeseniova, Roháčova	plněno průběžně	V roce 2017 pokračovaly práce na projektové dokumentaci a projednávání akce.	Vzhledem ke složitosti akce - majetkové vztahy , technické problémy dochází ke zpoždění projednání a odsouhlasování jednotlivých částí akce.
OTSMI	11	Holeček (investice)	Opravy a zateplení fasád panelových domů	plněno průběžně	V roce 2017 byly stavebně dokončeny opravy domů - Jeseniova 15-25, Jeseniova 27-35, Jeseniova 37-41 - Ostromečská 3,5 a Buková 16-24, Českobratrská 7-11, Sabinova 8-10, Rokycanova 18.	
OTSMI	14	Holeček (investice)	MŠ Buková 26 - zařízení jeselského typu	plněno	V roce 2017 byla dokončena veškerá projektová příprava, získáno stavební povolení a stavba bude připravena k zahájení výběrového řízení na dodavatele a k realizaci.	

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Stav plnění	Komentář k plnění v roce 2017	Důvod zpoždění (v případě opoždění)
OTSMI	15	Holeček (investice)	ZŠ V Zahrádkách – rekonstrukce kuchyně a vestavba sauny	splněno	Stavba je dokončena, byla vybudována nová školní kuchyně s jídelnou a v suterénu vestavěna sauna pro potřeby ZŠ a MŠ. Bylo dokončeno v souladu s platnou SoD včetně dodatků.	
OTSMI	16	Holeček (investice)	Rekonstrukce bytového domu Štítného 40	plněno průběžně	V roce 2017 bylo dokončeno územní řízení a vydáno pravomocné územní rozhodnutí.	Vzhledem ke komplikovanému projednávání s OOP MHMP došlo k prodloužení projektové přípravy.
OTSMI	17	Holeček (investice)	Biskupcova 31 – oprava budovy a interiéru kina AERO	plněno průběžně	V roce 2017 byla dokončena projektová dokumentace pro realizaci stavby.	Akce není v rozpočtu MČ na rok 2018.
OTSMI	79	Holeček (investice)	Dům sociálních služeb K Lučinám	plněno průběžně	V roce 2017 byly vytvořeny studie nového objektu, byla vybrána nejvýhodnější varianta a byla zpracována detailní studie pro projednání s občany, která byla veřejně představena.	Projektová příprava nebyla zahájena vzhledem ke komplikovanému projednání výstavby DSS s občany.
OÚR	13	Holeček (investice)	Výstavba nového občerstvení a veřejného WC na Parukářce /v návrhu rozpočtu pod názvem "Křížek - výstavba občerstvení" (převzato od OÚR)	splněno částečně	Vydané ÚR bylo napadeno odvoláním a odvolací orgán nařídil stavebnímu úřadu znovuoobnovení řízení, před obnovením ale bylo doporučeno požádat o prodloužení lhůty, které bude využito k vyřešení majetkoprávního problému s potřebným odstraněním stávající problematické stavby.	Došlo ke zpoždění, realizace vyžaduje přednostní vyřešení majetkové právního problému.

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Stav plnění	Komentář k plnění v roce 2017	Důvod zpoždění (v případě opoždění)
OÚR	19	Vítkovská (doprava)	Bezpečné přechody pro chodce a zvýšení kvality veřejného prostoru v oblasti tramvajových zastávek na Olšanském náměstí	splněno	Studie proveditelnosti dokončena a upravena podle výstupů participačního procesu s veřejností, následně dle předchozích dohod odeslána TSK HMP ke zpracování DÚR.	TSK HMP se zahájením pořízení DÚR čeká na dodání navazujícího úseku Táboritřská Seifertova, jehož studii proveditelnosti pro IPR Praha zpracovává kancelář Edit architekti.
OÚR	20	Hujová (územní rozvoj) Materna (životní prostředí) Holeček (investice)	Nová rekreační cesta pro pěší a cyklisty podél severní hrany Olšanských hřbitovů	neplněno	Podle dohod měl studii formou architektonické soutěže pořídit IPR Praha, avšak nestalo se tak, údajně proto, že jeden z klíčových pozemků řešeného území vlastní Pražské služby a jednáním s nimi nedošlo k příslibu možnosti zapojení do projektu (majetkoprávní problematika).	Došlo ke zpoždění, ve věci nutno rozhodnout, zda má MČ P3 pořídit zpracování studie i s rizikem nerealizovatelnosti v současném majetkoprávním stavu, nebo zda nejprve požadovat po HMP převedení klíčového pozemku do majetku města.

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Stav plnění	Komentář k plnění v roce 2017	Důvod zpoždění (v případě opoždění)
OÚR	21	Hujová (územní rozvoj) Materna (životní prostředí) Holeček (investice)	Nástupy na Parukářku od severu	splněno částečně	Získání jednoho z možných vstupů zajištěno smluvně a projektově v DÚR záměru společnosti WH Estate, stavba ale doposud nezahájena, investor čeká na získání ÚR.	Studie dalších nástupů je možno zadat pouze ve spekulativní podobě, protože jejich reálnost závisí na získání pruhů pozemků na hranách oplocených soukromých pozemků (související s celkovou strategií zahájení pokusů o vykoupení soukromých parcel v parku a jeho okolí).
OÚR	22	Vítkovská (doprava) Hujová (územní rozvoj) Holeček (investice)	Vybudování nového schodiště a rampy mezi ulicemi Lipanská a Seifertova	plněno průběžně	Studie kanceláře Edit architekti byla zpracována pro IPR Praha. Pracovní komise pro regeneraci památkové zóny kritizovala její nevhodnou podobu a na základě jednání se ředitelem IPR Boháčem došlo k dohodě a nyní OÚR objednal novou variantu části řešeného veřejného prostoru.	Varianta studie bude dokončena až v roce 2018 a po odevzdání celé studie se předpokládá, že ji IPR Praha vyhodnotí a zašle na TSK HMP s pokynem zadat DÚR na rekonstrukci uličního parteru Olšanské náměstí - Táboritská – Seifertova.

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Stav plnění	Komentář k plnění v roce 2017	Důvod zpoždění (v případě opoždění)
OÚR	24	Hujová (územní rozvoj)	Revitalizace Tachovského nám.	splněno částečně	V projektové přípravě došlo ke zpoždění vlivem převodů pozemků mezi SŽDC s.o, Českými drahami a.s. a HMP. V roce 2017 se však podařilo získat ÚR na rekonstrukci náměstí a zadat zpracování DSP a její projednání.	V roce 2018 se očekává získání SP a zadání realizační dokumentace a příprava výběru dodavatele. Očekávatelná realizace v roce 2019 je ale komplikována plánovanou realizací rekonstrukce ulice Koněvovy.
OÚR	25	Hujová (územní rozvoj)	Spolupráce na přípravě urbanistické koncepce brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov	splněno	Městská část Praha 3 požádala o ukončení změny Z2600/00 územního plánu a zpracování podkladů včetně role žadatele převlal MHMP.	V současné době MČ P3 dle doporučení VÚR pouze zasílá své dříve odsouhlasené požadavky zpracovateli podkladů a pořizovateli změny.
OÚR	26	Vítkovská (doprava)	Cyklogenerel pro území MČ Praha 3	neplněno	Původní návrh cyklogenerelu z roku 2012 nebyl v orgánech MČ P3 doposud schválen ani nebyly vysloveny požadavky na zpracování nového návrhu.	Úpravy komunikací pro cyklisty jsou proto realizovány dle pravidel HMP dílčími stavbami TSK HMP.

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Stav plnění	Komentář k plnění v roce 2017	Důvod zpoždění (v případě opoždění)
OÚR	27	Vítkovská (doprava)	Instalace cyklostojanů na území MČ Praha 3	neplněno	Cyklostojany jsou osazovány společností TSK HMP průběžně. V roce 2017 ale nebyly osazeny žádné.	V roce 2018 se očekává osazení nějakého počtu cyklostojanů (pro TSK HMP dodává nově vybraný subdodavatel).
OÚR	28	Bellu (majetek)Holeček (investice)	HUB - rekonstrukce žižkovských lázní, Husitská 7	splněno částečně	Projektová příprava nového využití objektu v roce 2017 nedoznala změn.	Odbor OTSMI realizoval zabezpečení objektu oproti neoprávněným vniknutím.
OVVK	54	Hujová (vztah k veřejnosti)	Propagace aktivit městské části Praha 3	plněno průběžně	Koncepce Praha 3 - dobré místo pro život se zabývá propagací aktivit, zvýšením informovanosti a přiblížením poskytovaných služeb MČ Praha 3 jejím občanům. Realizace probíhá prostřednictvím Radničních novin a dalších periodik, webu, sociální sítě Facebook, Informačního centra, radnice MČ P3, ale také díky informačním plochám po celé oblasti Prahy 3. Plnění v roce 2017 probíhalo průběžně po celý rok a koncepce probíhá i v roce následujícím.	
OŽ	62	0	Poradenské centrum odboru živnostenského (dříve "Poradenství pro začínající podnikatele v informačním centru Milešovská 1, Praha 3")	plněno průběžně	V roce 2017 provozováno až na výjimky vždy v úterý v čase 09:00-12:00 hodin v prostorách IC Milešovská. Personálně byla služba zajištěna úředníky odboru živnostenského.	

4 Opakující se akce Akčního plánu na rok 2017

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Komentář k plnění v roce 2017
OE	55	Materna (finance)	Rozklikávací rozpočet	Rozklikávací rozpočet je v provozu na webu městské části zde: http://www.praha3.cz/rozpocet/ .
OSV	41	Gregor (sociální)	Bezdomovectví - terénní program	Ke dni 1. 11. 2014 byla uzavřena příkazní smlouva o zajištění terénního programu pro osoby bez přístřeší s účinností na rok a možností prodloužení na další období. Terénní program probíhá v rozsahu 20 hodin týdně a je zajišťován dvěma pracovníky organizace Naděje. V roce 2017 byl celkový počet kontaktů 1 308 (302 ženy, 1 006 muži, 228 cizinci, 14 osoby do 26 let). Celkem bylo uskutečněno 119 doprovodů nebo převozů a 12 kontaktů zdravotníka.
OSV	42	Gregor (sociální)	Dětské preventivní výjezdy	Každoročně je uskutečňováno několik různorodých výjezdů, kde se děti mohou identifikovat s pozitivními vzory a s pozitivními normami společenského chování. Hry, besedy a exkurze jsou tematicky zaměřeny na problematiku prevence sociálně patologických jevů. V roce 2017 bylo zrealizováno celkem 7 dětských preventivních výjezdů (5 víkendových a 2 jednodenní). Výjezdy bylo podpořeno celkem 58 unikátních klientů.
OSV	43	Gregor (sociální)	Projekt obce na podporu integrace cizinců	V roce 2017 byly zrealizovány kurzy češtiny pro cizince, akce „Poznejme se, sousedé“, projekt „So far – so near“ na ZŠ Lupáčova, doučování češtiny pro děti cizince na základních školách, asistent pedagoga v rámci CPD DDM Praha 3 – Ulita, přednášky o migraci a cizincích pro širokou veřejnost, kurzy sociokulturní orientace, podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Jeseniova a tvořivé dílny pro děti z MŠ Perunova, MŠ Žerotínova a MŠ Jeseniova 98, aktualizace informací pro cizince na webových stránkách MČ Praha 3 a 9. celostátní konference projektů obcí o integraci cizinců. Celkem bylo projektem podpořeno 2 731 osob.


Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Komentář k plnění v roce 2017
OSV	44	Gregor (sociální)	StreetBus - mobilní terénní sociální služba	Ve vtypovaných lokalitách působí StreetBus vždy 1x – 2x týdně 5 hodin. Dětem je pracovníky nabídnuto a umožněno smysluplné trávení volného času, pomoc se školní přípravou, sociální poradenství, které je zaměřené zejména na problematiku prevence kriminality, užívání návykových látek, pohlavně přenosných chorob a další osvěty. V roce 2017 bylo zajištěno 215 hodin mobilní terénní sociální služby a podpořeno 154 unikátních klientů.
OSV	45	Gregor (sociální)	Terénní programy - drogy	Zajištění terénního programu proběhlo za rok 2017 od dvou dodavatelů (Progressive a Drop in) ve sjednaném rozsahu. V rámci programů probíhal denní a noční monitoring terénu, sběr a výměna použitého materiálu a práce s uživateli návykových látek. DROP IN zajistil práci v terénu v roce 2017 v rozsahu 30 hodin měsíčně (22 hodin denní monitoring a terénní program na otevřené i uzavřené drogové scéně; 8 hodin noční monitoring a terénní program na otevřené i uzavřené drogové scéně). Celkově se v průměru pracovalo se 180 klienty. Výměny na uzavřené drogové scéně se pohybovaly ve výši cca 800 kusů stříkaček a dalšího injekčního materiálu za 1 měsíc, což znamená, že v roce 2017 bylo provedeno asi 9 600 výměn na uzavřené scéně. Na otevřené drogové scéně bylo za rok 2017 vyměněno cca 10 000 kusů stříkaček. Progressive zajistil v roce 2017 terénní program pro uživatele návykových látek v rozsahu 40 hodin měsíčně. Za období leden – prosinec 2017 bylo sebráno celkem 3 750 ks injekčních stříkaček. Organizace Progressive také obsluhuje kontejnery Fixpoint, které slouží k bezpečné likvidaci injekčních stříkaček. Jejich cílem je minimalizovat výskyt pohozených injekčních stříkaček na veřejném prostranství. V roce 2017 bylo na území městské části Praha 3 v kontejnerech FIXPOINT nalezeno celkem 563 kusů injekčních stříkaček.

Zpracoval odbor	číslo	Předkládá	Název záměru	Komentář k plnění v roce 2017
OSV	46	Gregor (sociální)	Veletrh sociálních služeb a neziskového sektoru	Dne 8. 6. 2017 byla uskutečněna akce Veletržka aneb Veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 3. Akce se zúčastnilo 50 organizací poskytujících sociální nebo návazné služby pro občany Prahy 3.
OSV	47	Gregor (sociální)	Programy pro seniory	V roce 2017 bylo realizováno 10 výletů, 6 přednášek, 4 taneční odpoledne, 6 vycházek, PC kurzy, 2 oslavy životních jubileí seniorů a institut ombudsmana pro seniory rozsahu 12 hodin týdně.
OSV	48	Gregor (sociální)	Oslavy Mezinárodního dne seniorů	V rámci Oslav Mezinárodního dne seniorů (25. 9. - 29. 9. 2017) byl uskutečněn Sportovní den na náměstí Jiřího z Poděbrad, koncert – Francouzský šanson, promítání filmů v kině Aero, přednáška a Taneční odpoledne v hotelu Olšanka.
OSV	49	Gregor (sociální)	Dobrovolník roku 2017	Akce proběhla dne 12. 12. 2017 v koncertní a výstavní síni Atrium na Žižkově. Celkem bylo nominováno a oceněno 13 dobrovolníků.
OSV	50	Gregor (sociální)	Mikulášská nadílka pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin z MČ Praha 3	Cílem je materiální a duševní podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Akce proběhla 2. 12. 2017 a dárkové balíčky byly rozdány 180 dětem.
OŠ	52	Suková (školský)	Zajištění prázdninového provozu MŠ	Na základě požadavků rodičů schvaluje v dubnu RMČ rozsah provozu.

5 Shrnutí

Na konci roku 2017 bylo z 55 projektových záměrů „splněno“ 11 (20 %), „plněno pravidelně“ 2 (4 %), „plněno průběžně“ 16 (29 %), „plněno“ 16 (29 %), „splněno částečně“ 4 (7 %). „Neplněno“ bylo 6 projektových záměrů (11 %).

Graf č. 1: Míra naplnění aktivit akčního plánu

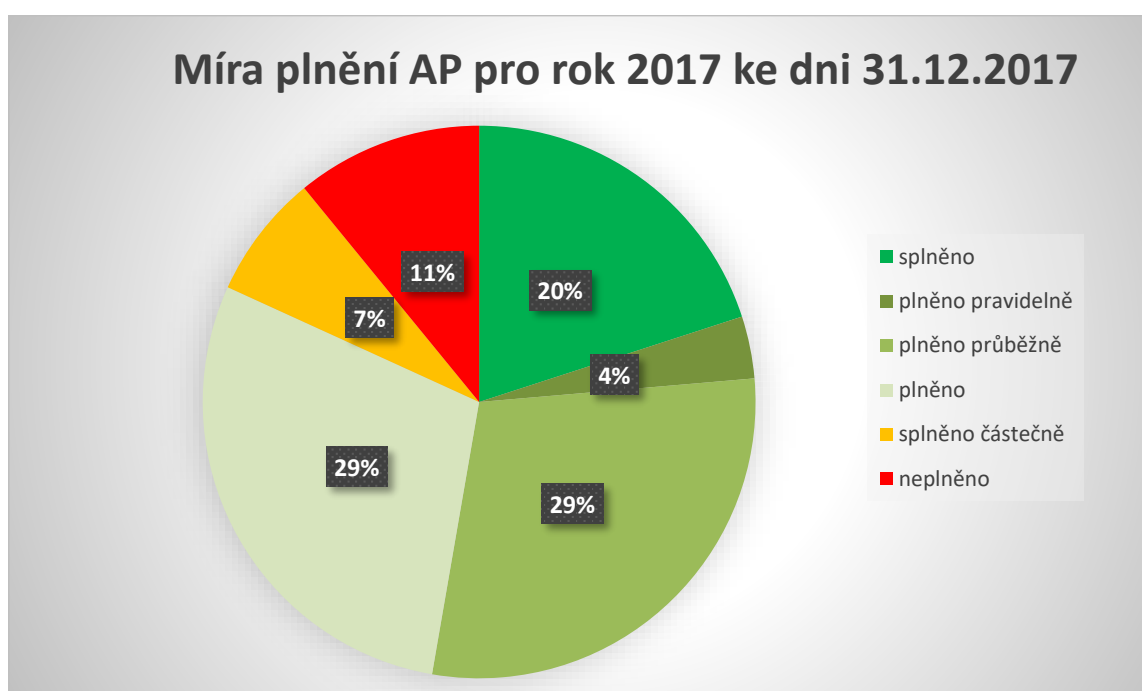

Důvodová zpráva

Zpracoval: Jonáš Merta, vedoucí odboru organizačního

Strategický plán rozvoje Městské části Praha 3 představuje základní strategický dokument pro období 2014 až 2020.

K naplňování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 (dále jen SPR MČ P3) se zpracovávají jednoleté akční plány, jejichž plnění je podle schválené metodiky hodnoceno v pololetních intervalech.

Aktualizovaná verze Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 pro období 2014 - 2020 byla schválena usnesením zastupitelstva č. 443 dne 9. 6. 2014.

Akční plán na rok 2017 naplňující výše zmíněný Strategický plán rozvoje MČ Praha 3 schválilo zastupitelstvo MČ Praha 3 usnesením č. 249 při svém zasedání dne 20. 12. 2016. Akční plán na rok 2017 obsahuje seznam 55 aktivit - projektových záměrů, jejichž realizace byla v průběhu roku 2017 plánována a jimiž naplňuje svou vizi rozvoje, strategické cíle a programové úkoly obsažené v Strategickém plánu rozvoje MČ P3.

Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje průběžné vyhodnocování plnění, tedy porovnání skutečnosti s plánem. Průběžné vyhodnocování umožňuje včas zjistit případné problémy a přijmout potřebná opatření. Při jednoletých akčních plánech zvolila MČ P3 půlroční interval hodnocení.

Proto ke konci června 2017 proběhlo průběžné posouzení plnění Akčního plánu 2016 a ke dni 31. 12. 2017 bylo provedeno vyhodnocení akčního plánu po dokončeném roce.

Vyhodnocení akčního plánu oproti předchozím letům obsahuje dle požadavků řídicí skupiny dvě novinky. Jednak v případě opožděného plnění projektového záměru je ve vyhodnocení uvedena příčina, proč ke zpoždění oproti plánu došlo. A jednak jsou nově vyhodnocovány i projektové záměry, které mají charakter „každoročně se opakujících akcí“.
